



Chers fondateurs, chers amis de Villemont,

Cet automne et le début de l'hiver auront été marqués par une pause forcée dans la réalisation des travaux : nous sommes en attente des tuiles pour terminer la toiture du colombier (la lettre n° 10) ; et donc dans l'impossibilité de déplacer l'échafaudage vers le château pour démarrer les travaux de façades.

C'est pourquoi nous avons travaillé à approvisionner le chantier en pierres, en pièces de bois où en matériel. Puis, en raison des intempéries, nous nous sommes employés à diverses reprises d'intérieur.

Au moment de ces quelques lignes, Jess et Aubin, les compagnons de Villemont, s'emploient à poser le dallage des cuisines.

Vivement les premiers beaux jours : car nous pourrons enfin reprendre les restaurations lourdes. D'abord terminer le colombier (*ci-dessus sous un léger manteau de neige*), puis démarrer l'étré sillonnement des baies du corps de logis (pièces de bois placées obliquement pour éviter la déformation) avant d'entamer la restauration des maçonneries. Peut-être de belles photos dans la lettre n° 12.



récupération de matériaux



un des voyages pour le transport de 45m² de dalles, en provenance de Sussat (Allier), et destinées aux cuisines.



ces poutres et planches, entreposées pour séchage dans la chapelle, proviennent des coupes d'arbres du parc





On imagine difficilement la quantité impressionnante de pierres nécessaires à la mise en œuvre des travaux de restauration en maçonnerie : il a fallu plus d'un mois (à deux) pour récupérer dalles, jambages et linteaux, parfois loin de nos bases (jusqu'à 30 km dans l'Allier où la pierre calcaire présente la même densité, la même veine, et la même couleur blanc/gris que la nôtre dite « de Chaptuzat »).



le four à pain

Les pierres qui marquent l'entrée du four à pain, dans les cuisines (*ci-dessus et ci-contre*) avaient subies les affres du temps mais aussi celles du vandalisme qui a sévi des années à Villemont. Elles ont dû être retaillées (voir la lettre n°6). Et, cet hiver, le nouvel appareillage a été posé.

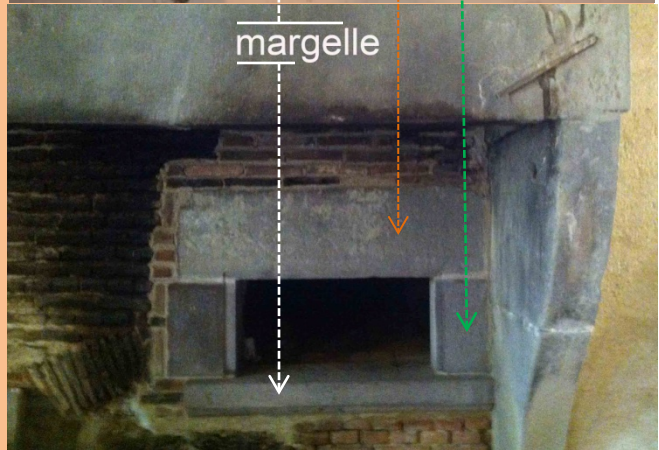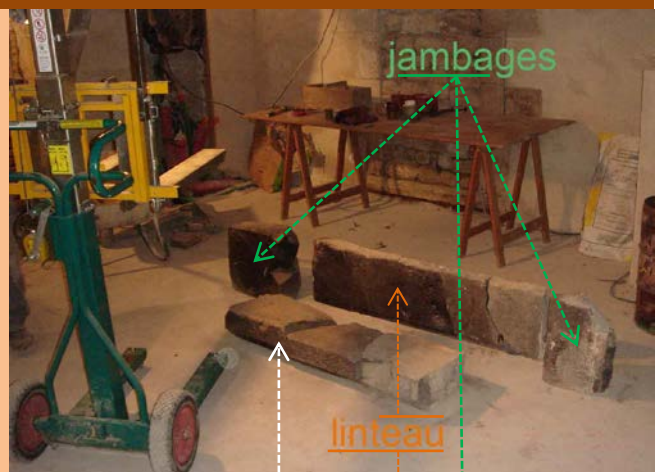

*en cours :
pose de la
margelle
en appui*

*four
terminé*

dallage cuisines

Avant de sceller les pierres au mortier de chaux sur la dalle coulée en mars 2011 (voir la lettre n°4), il a fallu d'abord passer les canalisations de chauffage (*photo de droite*); puis préparer un calepinage (dessin préparatoire de l'organisation au sol) qui tienne compte des dimensions de la pièce. Les dalles ont ensuite été ajustées en largeur pour pouvoir constituer des lignes régulières.



essai d'alignement
passage des canalisations de chauffage



les murets

A la fin de l'automne, la construction des murets s'est poursuivie en fond de parc ; ils sont destinés à retenir les talus créés après le terrassement de la plateforme (la lettre n°3). Après avoir posé les seuils d'escalier (la lettre n°11) les piliers latéraux en pierre de taille ont été mis en place. Puis les parements montés en moellons dressés.
